



PILOTES Y OBRAS S.A.

PILOTES Y OBRAS S.A.

XXXXXX

Contrato:XXXXXX

T6.E.P25

Pilote:

Diámetro: 1000 mm
Paso: 8 cm
Inclinación X/Y: -0.1% / 0.1°
Profundidad: 25.03 m
Superconsumo: 11 %
Volumen: 21731 L

Perforación

Fecha de inicio: 30/09/08
Fecha de término: 30/09/08
Hora de inicio: 12:24:00
Hora de término: 13:47:00
Duración: 01:22:59

Concretagem

Fecha de inicio: 30/09/08
Fecha de término: 30/09/08
Hora de inicio: 16:25:00
Hora de término: 17:10:00
Duración: 00:37:14

MT↓
bar


VR↓
rpm

VA↓
m/h

Perfil

PC↑
bar

VS↑
m/h

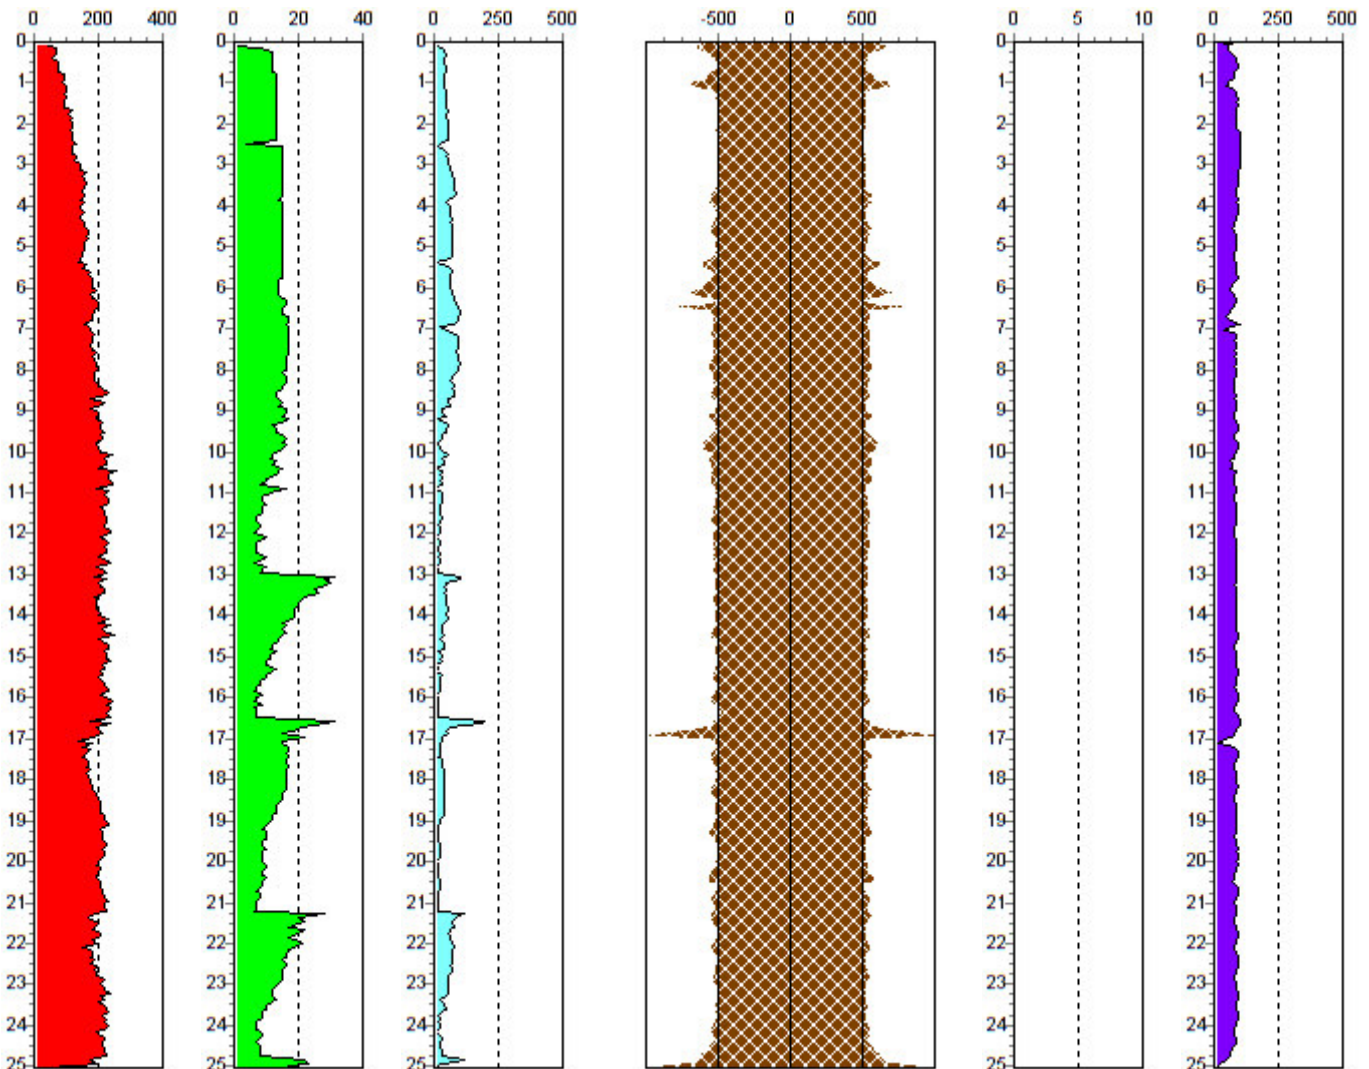

MT - PRESION DE PERFORACION
VA - VELOCIDAD DE DESCENSO
PC - PRESION DE HORMIGONADO

VR - VELOCIDAD DE ROTACION
Perfil - PERFIL DEL PILOTE
VS - VELOCIDAD DE SUBIDA

j.cortizo@pilotesyobras.com

Resp.Cliente

LLamada - www.llamada.es
